『광안리 발코니 음악회 행사 용역』

정성적 평가서

2026년 2월 10일

Contens

Part Ⅰ
제안개요
1 제안의 목적 및 배경
2 제안의 범위
3 제안의 특징 및 장점
4 기대효과

Part Ⅱ
추진계획
1 사업 총괄계획
2 세부 추진계획
3 행사장 구성 계획
4 인력운영계획
5 자원과 네트워크 활용계획

Part Ⅲ
사업관리
1 추진일정 및 업무분장
2 전담인력 투입계획(참여인력 이력사항)
3 업무보고 및 검토 계획
4 안전 및 방역 관리 계획
5 비상 대응 계획

Part Ⅳ
홍보 / 마케팅
1 홍보 / 마케팅
2 기념품 디자인 / 제작

제안개요

1. 제안의 목적 및 배경
2. 제안의 범위
3. 제안의 특징 및 장점
4. 기대효과

Part Ⅰ. 제안개요

1. 제안의 목적 및 배경

1) 제안의 목적 및 배경

수영구, 오는 31일 '발코니음악회' 개최

부산일보 2026.01.13.

부산 수영구(구청장 강성태)는 오는 31일 오후 7시 15분 수영구 생활문화센터에서 광안리 '발코니음악회'를 개최한다고 밝혔다.

'발코니음악회'는 매월 마지막 주 토요일 광안리 테마거리에서 수영구생활문화센터 발코니를 바라보며 관객들이 함께 즐길 수 있는 수영구 대표 야외 음악회로 특히 광안리 M 드론 라이트쇼 1부 종료 직후 이어서 진행돼 관람객들에게 더욱 풍성한 주말 문화 경험을 제공하고 있다.

이번 1월 공연은 남녀 혼성 5인조 그룹 '비스타(VISTA)'가 출연하여 추억의 복고풍 댄스 음악부터 최신 K-POP까지 전 세대를 아우르는 대중가요 메들리를 선보이며, 화려한 댄스 퍼포먼스와 함께 겨울밤을 뜨겁게 물들일 예정이다.

수영구는 "발코니음악회는 일상 속에서 주민과 관광객 구만의 생활문화 프로그램"라며 "1월 보일 예정이니 많은 관

광안리, 개장 이후 처음 해운대 넘어서..글로벌 문화도시로"

BBS 2025.12 09.

-단순 방문 통계 아닌 여행자들의 경험과 감성으로 전국 1위
-수영구, 스포츠 투어리즘 관광정책으로
-연말연시도 광안리와 민락수변공원에서
-문화관광재단 기초지자체 최초로 설립 추진 중
-광안리M드론라이트쇼, 대한민국 대표 야간 관광프로그램로 성장
-멋진 포토존도 광안리에 설치

공연문화확산, 대중 예술과 시민의 가교

수영구 대표 야외 음악회

▼

'광안리 발코니 음악회'
대한민국 대표 야외 음악회로 성장

1.과업개요

과업명	「광안리 발코니음악회」 행사 용역
사업기간	착수일로부터 10개월 행사 기간 : 2026. 3월 ~ 12월,총 10회 운영 행사 일정 : 매월 마지막 주 토요일 1회 개최 (동절기 10~12월) 19:15~20:15, (하절기 3~9월) 20:15~21:15
행사장소	수영구생활문화센터 발코니
주요과업	1) 과업에 지시된 공연의 기획・구성・연출・집행・장소정비・행사준비・행사진행 2) 출연자(공연팀, 연주팀 등) 섭외 및 행사 운영 책임자・전문인력 배치 3) 공연무대 조성 및 제작・설치, 음향 및 조명장비 등 설치 및 운영 4) 행사장 안전 및 재해 대책에 관한 사항(기상 상황, 관객 및 보행자 안전관리 등) 5) 기타 행사 개최 및 운영에 필요한 사항으로 발주처와 협의한 내용 6) 최종 결과보고서 제출

3. 제안의 특징 및 장점

1) 제안의 특징 및 장점

01 행사 기획의 차별화

- 10회 공연 프로그램 및 프로그램의 프로세스 체계화
- 관객 호응과 참여를 이끄는 공연 프로그램
- 공연 외 향유 만족도를 높이는 기획
- 다양한 행사 경험으로 검증된 프로그램

전문성

02 안전한 공연 향유 환경

- 안전한 공연을 위한 시설, 장치 운영
- 공연 전후 시간 물리적 동선 분리
  - 관람객 밀집에 대비한 안전 관리 시스템

안전

광안리
발코니
음악회

03 지역을 위한 프로그램

- 지역 아티스트 오픈스테이지
  (메인공연 10분전 사전공연)
- 상권 연계 체류형 프로그램 기획
  (수영구민과 관광객의 상생을 위한 프로그램)

상생

04 대표 야외 공연 브랜드

- 글로벌 관광 거점화
  (광안리 M 드론라이트쇼 등 대형 행사와 연계된 야간 간광 프로그램로 브랜딩)
- 공연 프로그램 아카이빙으로 지속적인 브랜딩

브랜딩

Part Ⅰ. 제안개요

4. 기대효과

1) 기대효과

행사 기획 및 운영계획

1. 행사 기획 및 연출
2. 연간 총괄 계획
3. 월별 세부계획
4. 특별공연계획
5. 행사장 구성 계획
6. 인력 운영계획

Part Ⅱ. 사업추진계획

1. 사업 총괄 계획

1) 비전

“ 매월 마지막 주 토요일 광안리의 밤을 밝히는 공연 ”

K-로컬의 중심

테라스와 광안리 해변을 잇는 이색적인 공간연출로 차별화된 K-공연 문화

참여형 공연 문화

사전 사연 접수 및 전광판 송출을 통한 양방향 소통형 문화 콘텐츠 정착

세계적 관광 거점

드론쇼 연계 및 외국인 친화적 콘텐츠 구성으로 글로벌 야간 관광 브랜드화

지속가능한 상생

지역 아티스트 기용 및 상권 연계, 생분해 용액 사용 등 친환경·상생 축제 실현

KEYWORDS

다시 찾고 싶은 광안리,
광안리 밤바다, 발코니에서 울려 퍼지는 낭만과 소통의 하모니

Part Ⅱ. 사업추진계획

1. 행사기획 및 연출

2) 사업 추진전략

대한민국 대표 야외 공연 프로그램 '광안리 발코니 음악회'

성공 전략

[기획/연출]	[운영/소통]	[시스템/기술]
다층적 공간활용 + 지역 아티스트와 상생	실시간 사연 소개 '광안리 낭만' 바이럴 확산	광안리 야경과 공존하는 빛 창의적인 공연 / 퍼포먼스

수영구민과 관광객 모두가 경험하는 다층적/상생공연 프로그램

대한민국을 대표하는 '야외 야간 음악회' 브랜드로 자리매김

지역 예술 생태계 선순환 및 광안리 해변 상권 활성화 견인

Part Ⅱ. 사업추진계획

2. 연간 총괄 계획

3) 행사 프로그램 총괄

3월

광안리 봄, 바람

치즈

광안리의 봄을 깨우는 상큼하고 부드러운 공연

4월

봄, 하모니

라온

폭발적인 가창력과 섬세한 감성을 겸비한 팝페라 그룹으로, 클래식과 팝을 넘나드는 웅장한 하모니를 선보입니다.

5월

소중한 시간

카우칩스

온 가족이 함께 즐기는 신나는 펑키 비트
부산을 기반으로 활동하는 실력파 펑크 밴드로,
빈티지한 사운드와 유쾌한 에너지가 돋보이는 팀
입니다.

Part Ⅱ. 사업추진계획

2. 연간 총괄 계획

3) 행사 프로그램 총괄

6월

달빛 아래

퓨전국악밴드 그라나다

초여름 밤바다와 어우러지는 퓨전국악 선율

7월

여름밤, 파도

육중완 밴드

무더위를 식혀줄 시원한 밴드 사운드

8월

광안리 카니발

노라조

압도적인 쇼와 에너지

Part Ⅱ. 사업추진계획

2. 연간 총괄 계획

3) 행사 프로그램 총괄

9월

달빛 아래 우리

보수동 쿨러

선선한 가을바람에 실려 오는 노래

10월

밤바다 영화관

위나

낭만적인 재즈

11월

가을밤, 여운

세이수미

감동을 이어가는 깊은 울림

12월

겨울밤의 선물

메츠클라

발코니에서 맞이하는 연말

Part Ⅱ. 사업추진계획

1. 사업 총괄 계획

4) 공연 프로그램 총괄표

Part Ⅱ. 사업추진계획

2. 세부 추진계획

1) 세부 공연 계획

3월의 음악회

광안리 봄, 바람

일시/장소	3. 28(토) 20:15 – 21:15 수영구생활문화센터 발코니	목표	관람객 000명 이상 / 무사고

광안리의 봄을 깨우는 상큼하고 부드러운 공연.

공연자(팀) 치즈

운영사항 **관객 사연 송출(LED) / 제로 웨이스트**

시스템 **중계LED 1EA / 배경 LED 5EA / 포그 / 레이저 / LED 조명**

홍보/마케팅 수영구청 홈페이지 / 블로그 / SNS

구 분	참 여 팀	비고
10:00~18:00	음향/조명/특수효과 설치	기술팀
18:00~20:15	시스템 최종 점검 및 향유 구역 동선 확보	
20:15~21:15	오픈 스테이지 / 메인 공연	
21:15~22:30	안내 멘트 송출 및 시스템 철수	LED, 안내음성

Part Ⅱ. 사업추진계획

2. 세부 추진계획

1) 세부 공연 계획

4월의 음악회

봄, 하모니

일시/장소	4. 25(토) 20:15 – 21:15 수영구생활문화센터 발코니	목표	관람객 000명 이상 / 무사고

행복을 노래하는 그룹, 라온의 즐거운 팝페라 '라온'은 순 우리말로 '즐거운' 이라는 뜻을 가지고 있습니다. 고전적인 크로스오버 음악에서 벗어나 대중들에게 친숙한 음악을 라온만의 방식으로 편곡하여 모두에게 즐거운 음악을 선물합니다.

공연자(팀) 라온

운영사항 **관객 사연 송출(LED) / 제로 웨이스트**

시스템 **중계LED 1EA / 배경 LED 5EA / 포그 / 레이저 / LED 조명**

홍보/마케팅 수영구청 홈페이지 / 블로그 / SNS

구 분	참 여 팀	비고
10:00~18:00	음향/조명/특수효과 설치	기술팀
18:00~20:15	시스템 최종 점검 및 향유 구역 동선 확보	
20:15~21:15	오픈 스테이지 / 메인 공연	
21:15~22:30	안내 멘트 송출 및 시스템 철수	LED, 안내음성

Part Ⅱ. 사업추진계획

2. 세부 추진계획

1) 세부 공연 계획

5월의 음악회

소중한 시간

일시/장소	5. 30(토) 20:15 – 21:15 수영구생활문화센터 발코니	목표	관람객 000명 이상 / 무사고

부산을 기반으로 활동하는 실력파 펑크 밴드로, 빈티지한 사운드와 유쾌한 에너지가 돋보이는 팀입니다.

공연자(팀) 카우칩스

운영사항 **관객 사연 송출(LED) / 제로 웨이스트**

시스템 **중계LED 1EA / 배경 LED 5EA / 포그 / 레이저 / LED 조명**

홍보/마케팅 수영구청 홈페이지 / 블로그 / SNS

구 분	참 여 팀	비고
10:00~18:00	음향/조명/특수효과 설치	기술팀
18:00~20:15	시스템 최종 점검 및 향유 구역 동선 확보	
20:15~21:15	오픈 스테이지 / 메인 공연	
21:15~22:30	안내 멘트 송출 및 시스템 철수	LED, 안내음성

Part Ⅱ. 사업추진계획

2. 세부 추진계획

1) 세부 공연 계획

6월의 음악회

달빛 아래

일시/장소	6. 30(토) 20:15 – 21:15 수영구생활문화센터 발코니	목표	관람객 000명 이상 / 무사고

국악기와 서양악기의 완벽한 조화를 추구하는 퓨전 국악 밴드로, 화려한 퍼포먼스와 비주얼을 자랑합니다.

공연자(팀) 그라나다

운영사항 **관객 사연 송출(LED) / 제로 웨이스트**

시스템 **중계LED 1EA / 배경 LED 5EA / 포그 / 레이저 / LED 조명**

홍보/마케팅 수영구청 홈페이지 / 블로그 / SNS

구 분	참 여 팀	비고
10:00~18:00	음향/조명/특수효과 설치	기술팀
18:00~20:15	시스템 최종 점검 및 향유 구역 동선 확보	
20:15~21:15	오픈 스테이지 / 메인 공연	
21:15~22:30	안내 멘트 송출 및 시스템 철수	LED, 안내음성

Part Ⅱ. 사업추진계획

2. 세부 추진계획

1) 세부 공연 계획

7월의 음악회

여름밤, 파도

일시/장소	7. 25(토) 20:15 – 21:15 수영구생활문화센터 발코니	목표	관람객 000명 이상 / 무사고

'바나나먹고싶다'로 뚜렷한 음악스타일을 보여준 육중완밴드는 반전된 감성으로 EP서울비둘기를 발매하여 현실의 틈 새에서 애환을 겪는 청춘들에게 위로의 메시지를 전달하고, 삶의 그늘을 밝히는 희망을 선사하였다

공연자(팀) 육중완 밴드

운영사항 **관객 사연 송출(LED) / 제로 웨이스트**

시스템 **중계LED 1EA / 배경 LED 5EA / 포그 / 레이저 / LED 조명**

홍보/마케팅 수영구청 홈페이지 / 블로그 / SNS

구 분	참 여 팀	비고
10:00~18:00	음향/조명/특수효과 설치	기술팀
18:00~20:15	시스템 최종 점검 및 향유 구역 동선 확보	
20:15~21:15	오픈 스테이지 / 메인 공연	
21:15~22:30	안내 멘트 송출 및 시스템 철수	LED, 안내음성

Part Ⅱ. 사업추진계획

2. 세부 추진계획

1) 세부 공연 계획

8월의 음악회

일시/장소	8. 29(토) 20:15 – 21:15 수영구생활문화센터 발코니	목표	관람객 000명 이상 / 무사고

광안리 카니발

압도적인 무대 장악력과 기발한 컨셉으로 무장한 대한민국 최고의 퍼포먼스 듀오입니다.
전 세대를 아우르는 히트곡 메들리와 폭발적인 에너지로 광안리 해변을 하나의 거대한 카니발로 만듭니다.

공연자(팀) 노라조

운영사항 **관객 사연 송출(LED) / 제로 웨이스트**

시스템 **중계LED 1EA / 배경 LED 5EA / 포그 / 레이저 / LED 조명**

홍보/마케팅 수영구청 홈페이지 / 블로그 / SNS

구 분	참 여 팀	비고
10:00~18:00	음향/조명/특수효과 설치	기술팀
18:00~20:15	시스템 최종 점검 및 향유 구역 동선 확보	
20:15~21:15	오픈 스테이지 / 메인 공연	
21:15~22:30	안내 멘트 송출 및 시스템 철수	LED, 안내음성

Part Ⅱ. 사업추진계획

2. 세부 추진계획

1) 세부 공연 계획

9월의 음악회

달빛 아래 우리

일시/장소	9. 26(토) 20:15 – 21:15 수영구생활문화센터 발코니	목표	관람객 000명 이상 / 무사고

부산 광안리를 기점으로 활동하는 서프 록 성향의 4인조 인디 록 밴드.

2014년에 1집 앨범 We`ve sobered up으로 데뷔 한 후, 2018년 2집 Where We Were Together를 발매했다.

공연자(팀) 보수동쿨러

운영사항 **관객 사연 송출(LED) / 제로 웨이스트**

시스템 **중계LED 1EA / 배경 LED 5EA / 포그 / 레이저 / LED 조명**

홍보/마케팅 수영구청 홈페이지 / 블로그 / SNS

구 분	참 여 팀	비고
10:00~18:00	음향/조명/특수효과 설치	기술팀
18:00~20:15	시스템 최종 점검 및 향유 구역 동선 확보	
20:15~21:15	오픈 스테이지 / 메인 공연	
21:15~22:30	안내 멘트 송출 및 시스템 철수	LED, 안내음성

2. 세부 추진계획

1) 세부 공연 계획

10월의 음악회

밤바다 영화관

일시/장소	8. 29(토) 20:15 – 21:15 수영구생활문화센터 발코니	목표	관람객 000명 이상 / 무사고

부산을 대표하는 재즈 보컬리스트로, 맑고 청아한 음색과 도시적인 감수성이 돋보이는 어반 재즈(Urban Jazz)를 선보입니다. 야경이 아름다운 광안리를 배경으로 영화 속 한 장면 같은 낭만적인 재즈 스테이지를 연출합니다.

공연자(팀) 위나

운영사항 **관객 사연 송출(LED) / 제로 웨이스트**

시스템 **중계LED 1EA / 배경 LED 5EA / 포그 / 레이저 / LED 조명**

홍보/마케팅 수영구청 홈페이지 / 블로그 / SNS

구 분	참 여 팀	비고
10:00~18:00	음향/조명/특수효과 설치	기술팀
18:00~20:15	시스템 최종 점검 및 향유 구역 동선 확보	
20:15~21:15	오픈 스테이지 / 메인 공연	
21:15~22:30	안내 멘트 송출 및 시스템 철수	LED, 안내음성

Part Ⅱ. 사업추진계획

2. 세부 추진계획

1) 세부 공연 계획

11월의 음악회

가을밤, 여운

일시/장소	8. 29(토) 20:15 – 21:15 수영구생활문화센터 발코니	목표	관람객 000명 이상 / 무사고

부산 광안리를 기점으로 활동하는 서프 록 성향의 4인조 인디 록 밴드.

2014년에 1집 앨범 We`ve sobered up으로 데뷔 한 후, 2018년 2집 Where We Were Together를 발매했다.

공연자(팀) 세이수미

운영사항 **관객 사연 송출(LED) / 제로 웨이스트**

시스템 **중계LED 1EA / 배경 LED 5EA / 포그 / 레이저 / LED 조명**

홍보/마케팅 수영구청 홈페이지 / 블로그 / SNS

구 분	참 여 팀	비고
10:00~18:00	음향/조명/특수효과 설치	기술팀
18:00~20:15	시스템 최종 점검 및 향유 구역 동선 확보	
20:15~21:15	오픈 스테이지 / 메인 공연	
21:15~22:30	안내 멘트 송출 및 시스템 철수	LED, 안내음성

Part Ⅱ. 사업추진계획

2. 세부 추진계획

1) 세부 공연 계획

12월의 음악회

겨울밤의 선물

일시/장소	8. 29(토) 20:15 – 21:15 수영구생활문화센터 발코니	목표	관람객 000명 이상 / 무사고

열정적인 탱고 리듬과 화려한 악기 연주를 통해 여름밤 광안리를 정열적인 무드로 탈바꿈시킵니다.

공연자(팀) 메츠클라

운영사항 **관객 사연 송출(LED) / 제로 웨이스트**

시스템 **중계LED 1EA / 배경 LED 5EA / 포그 / 레이저 / LED 조명**

홍보/마케팅 수영구청 홈페이지 / 블로그 / SNS

구 분	참 여 팀	비고
10:00~18:00	음향/조명/특수효과 설치	기술팀
18:00~20:15	시스템 최종 점검 및 향유 구역 동선 확보	
20:15~21:15	오픈 스테이지 / 메인 공연	
21:15~22:30	안내 멘트 송출 및 시스템 철수	LED, 안내음성

Part Ⅱ. 사업추진계획

3. 행사장 구성 계획

1) 행사장 구성

쾌적한 공연향유환경을 위한 구조물 설치

3. 행사장 구성 계획

2) 공간 연출

행사장 조성 / 연출

공연 전문업체와 연계하여 수영구생활문화센터의 인프라를 적극 활용하고 각 지역의 특색을 살리는 행사장 조성

▲LED 전광판(가로11.5m x 높이3.5m), 카메라 2대, 조명, 유무선 마이크 및 음향장비, 중계 콘솔 장비 등

Part Ⅱ. 사업추진계획

4. 행사장 운영 계획

3) 행사장 운영 관리

행사장 관리

ESG 철학을 축제 운영에 접목하여 환경, 윤리적, 사회적 가치 실현

친환경

청결한 친환경 행사장 혼합 폐기물 10%미만

- 재활용은 100%, 혼합 폐기물은 10%미만으로 진행하는 리사이클 캠페인
- 전문 청소, 폐기물업체와 축제장 정기 그린타임(청소시간) 관람객과 같이 운영

지역상생

- 행사 관계자는 근로기준법에 준하여 운영
- 축제 관계자도 관람객이 되는 참여자의 복지와 모객을 동시에 진행

부산 지역 인력 선발

수영구 청년 중심 선발 / 안전 관리(보조)

행사장 관련 제반사항 지역업체 100% 선발

철저한 인력 운영 준비 및 교육으로 계획

행사운영

확실한 대처와 보고 탄력적인 안전관리

- 행사장 내 보건소와 연계하여 의무실 상시 운영
- 교통과 소방,의료, 우천시 대책, 비상안전관리 대책 수립과 조직 체계구성

Part Ⅱ. 사업추진계획

4. 인력운영계획

1) 참여인력

전문요원을 제외한 운영인력은 지역민 우선채용

전문인력 배치로 최상의 운영관리 시스템 구축

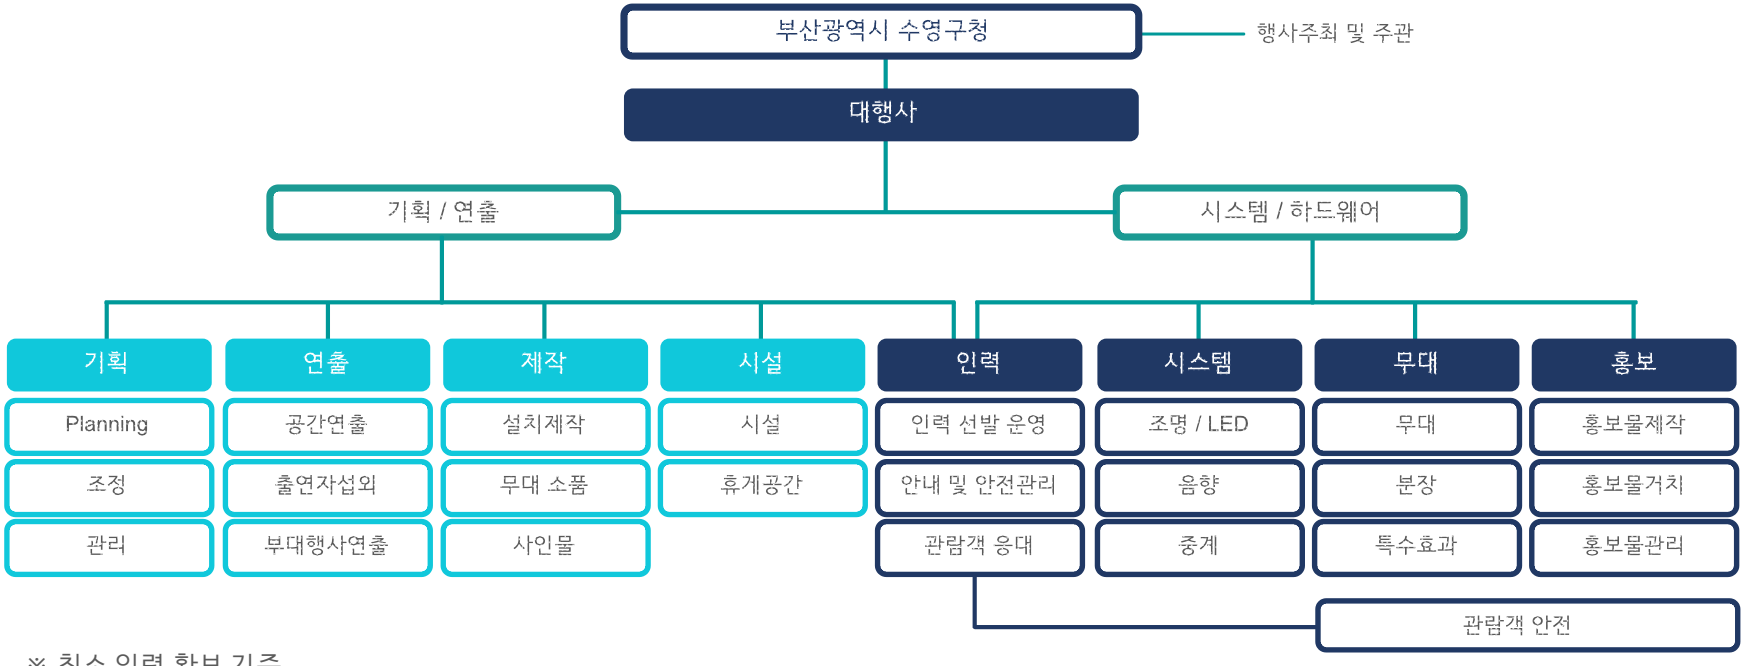

※ 최소 인력 확보 기준

계	관리팀장	사회자	안전관리 보조요원	무대운영 보조요원	안전관리자	부대프로그램	통역전문요원	경호·경비
16	1	1	4	2	2	1	1	4

2) 사업수행실적

III

사업 관리

1. 추진일정
2. 전담인력 투입계획(참여인력 이력사항)
3. 업무보고 및 검토 계획
4. 상황별 안전 및 방역 관리 계획
5. 비상 대응 계획

Part Ⅲ. 사업관리

1. 연간 운영 로드맵

1) 추진일정

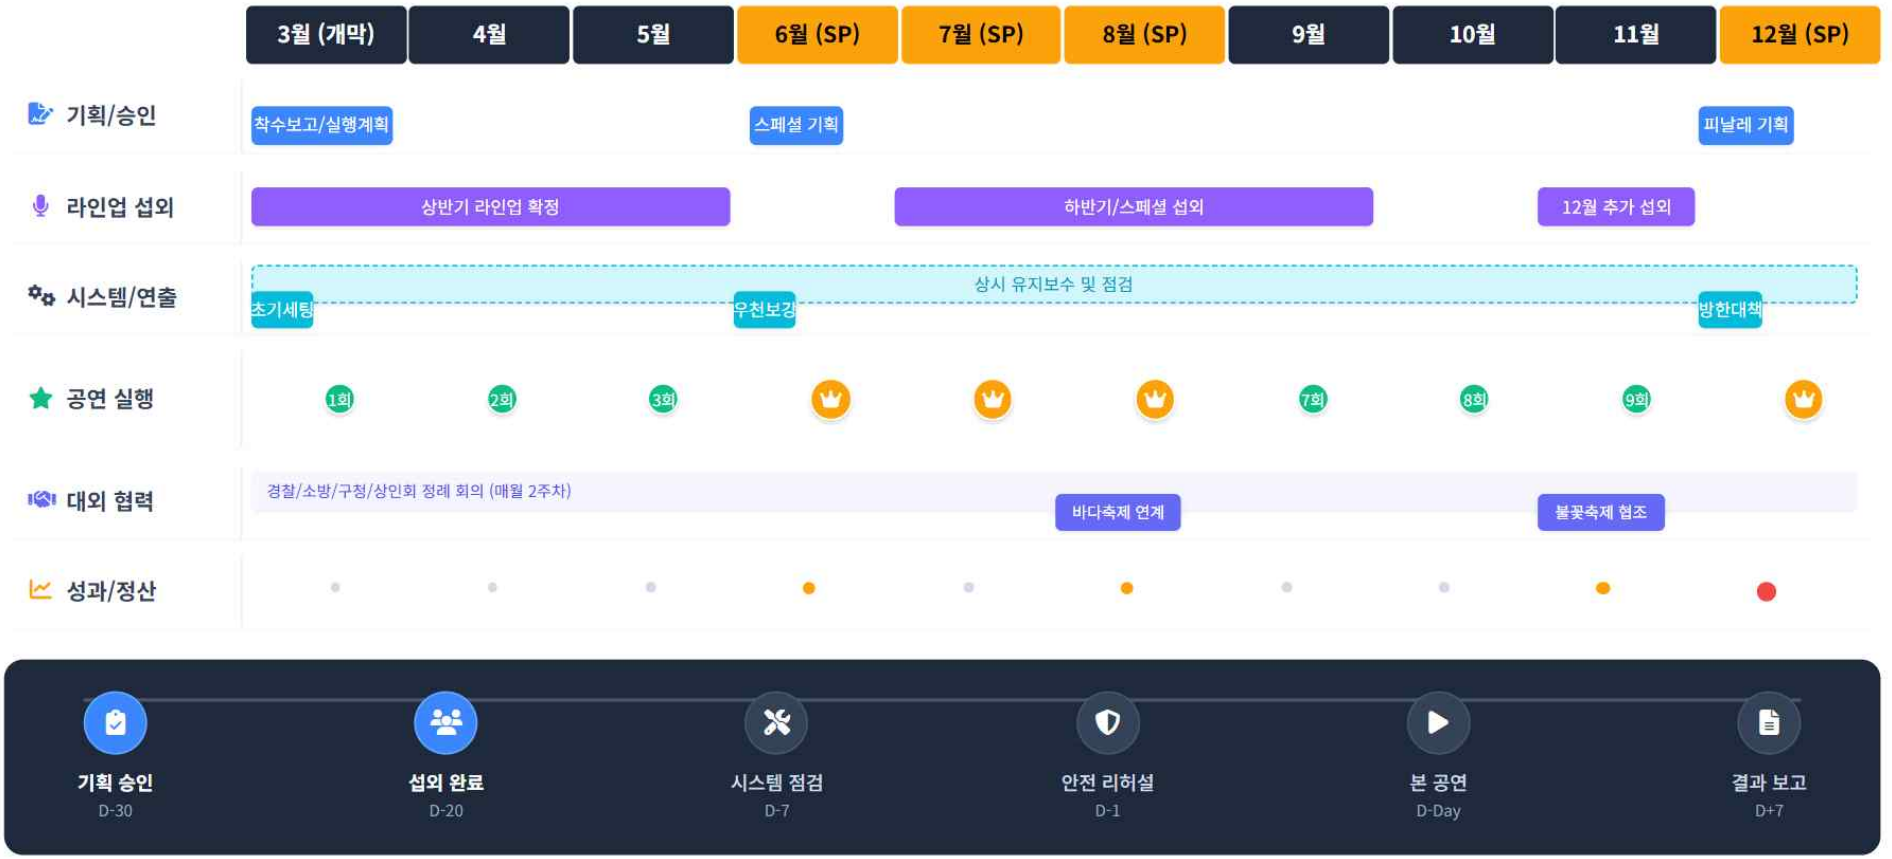

Part Ⅲ. 사업관리

1. 연간 운영 로드맵

1) 추진일정

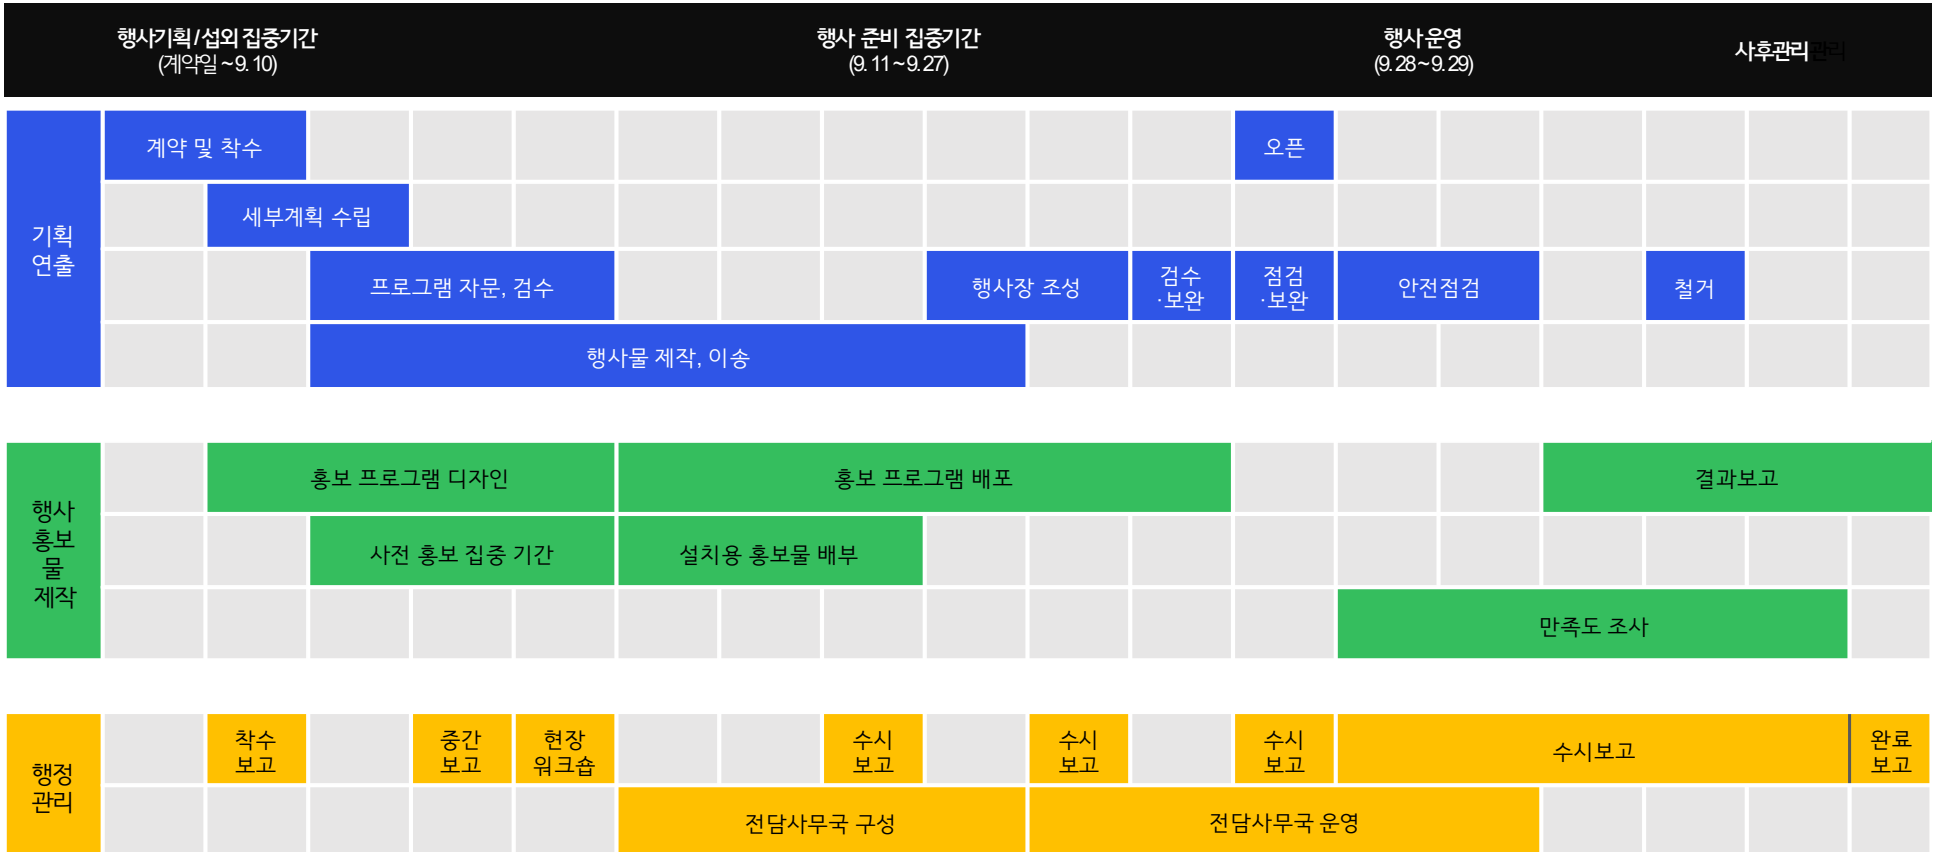

원활한 커뮤니케이션과 체계적인 사업 관리를 위한 '보고 프로세스' 구축 및 보고

착수 보고 > 중간 보고 > 수시 보고 > 성과품 납품 > 결과 보고

제안사 추진사항 / 사업관리 보고체계

추진계획 작성 / 제출

- 기본 계획서 및 산출내역서
- 예정공정표, 참여인력, 보안각서
- 세부추진일정 / 예산활용 세부내역 등
- 홍보물 기획 완료 시점
- 촬영계획 (촬영감독 / 일정 및 기법)

중간보고

- 총괄 사업추진계획
- 유연한 수정보완계획
- 발주처 요청 또는 주요 결정사항 반영
- 주요 이슈별 수시보고자료 확인

주요이슈별 수시보고자료

- 정기보고
- 진행상황 및 특이사항 보고
- 월별 추진결과 / 향후 추진계획
- 세부과업별 추진 、 기타사항
- 기타 발주처 요구사항 수렴 결과

성과품 납품

- 성과품 일체
  - 、 개발소스 및 실행파일
  - 、 행사+홍보물 일체
  - 、 만족도 설문조사 등

결과 보고

- 과업수행 결과보고 및 완료보고서

발주처 점검사항

추진계획서 점검

- 총괄 사업추진계획 승인
- 업무일정 조율
- 세부추진일정,예산활용 세부내역 검토

중요 추진사항 점검

- 수정보완계획 검토
- 발주처 요청사항 반영
- 주요 이슈별 수시보고자료 확인

세부과업별 추진사항 점검

- 추진결과 / 계획 점검
- 세부과업별 추진 、 애로사항 점검
- 기타 발주처 요구사항 점검

결과물 점검

- 결과물 점검

결과보고 점검

- 완료사항 점검
- 광고 목표 달성 확인

Part Ⅲ. 사업관리

4. 예산관리

1) 보고 프로세스 구축

구 분	내 용	항목별 비중
출연 섭외비	특별공연, 월별 로컬 아티스트 라인업 섭외	46.03%
시스템	무대 / 음향 / 조명 / 중계 등	31.59%
운영 인건비	총감독, 운영인력, 안전 관리자 및 안내 요원 배치	15.62%
시설물 및 제작물	보행자 및 관람객 안전 시설물	25.11%
기타경비	소모품, 행사 상해보험료 등	21.65%
총 사업비	대행 수수료, 일반 관리비를 제외한 순수 사업비 기준	100.00%

원활한 의사소통 체계

- 정확한 예산 시뮬레이션을 통한 예산 과집행 또는 부족사항 방지
- 과업 증감에 따른 예산 증감에 대한 정확한 이해를 위해 서면 커뮤니케이션 활용

효율성을 고려한 계획

- 예산 증감이 발생되는 경우, 전체 예산 집행 관점에서 협의 조정
- 프로그램에 따른 예산 분배의 타당성에 대한 충분한 사전협의를 통해 전체 효율성 제고

Part Ⅲ. 사업관리

5. 상황별 안전 관리 계획

1) 보험가입 및 상황별 맞춤 대책 수립

보험 관리 계획



시설안전관리

- 팀장 및 시설요원의 관리 역량 강화를 위해 관련 사전교육 실시
- 시설점검 일일보고하고 결과 기록은 현장에 비치
- 시설관리 팀장은 경험이 풍부한 사람을 배치
- 주요 점검항목 LIST에 따른 점검 실시 [표 1. 참조] 조치 계획

구 분	대 처 방 안
시설 안전관리 조직구성	• 긴급 상황 발생 시 대처할 수 있는 조직구성 • 유관기관 비상연락체계 구축
시설 안전관리 담당지정	• 팀장 및 시설관리요원은 위험 상황을 대비한 행동요령 반복 숙지
정보관리	• 시설이용 중에 발생한 문제 원인에 대해 공유하고 위험관리체계를 점검 • 빠른 조치와 전파를 위한 문제 상황 목록 작성
시설 안전관리에 대한 교육 및 예방	• 행사 전까지 점검 완료 • 구조물 점검 및 장비 점검 • 관리요원에 대한 지속적인 교육 및 점검 • 주의사항 안내문 및 방송을 통한 시설 안전사고 예방 안내 강화

관리 계획

인력, 시설물, 물자 등 모든 안전사고 및 천재지변으로 인한 재산 상해보험 가입
사고 발생 시, 주관 보험사와 즉각 연락을 취해 신속한 처리
시설 / 제작물 / 시스템 등 장비 파손, 대인보험
시설물자 등에 대한 각종 사건 발생을 대비하여 합리적 방안 강구
사고 발생으로 참가자 및 제삼자의 법률상 손해배상 대비

구분	No	항 목	점검사항		
			적합	부적합	지적
시설물	1	모든 시설물의 내·외벽에 균열은 없는가?			
	2	몽골텐트는 잘 고정되어 있는가?			
	3	벽체 및 바닥의 누수는 없는가?			
	4	각 디딤판은 미끄럽지 않도록 유지되어 있는가?			
	5	행사장 주변 붕괴 위험은 없는가?			
이동 동선	1	주출입구 주변 장애물은 없는가?			
	2	주출입구의 펜스는 통행, 피난 및 방향전환 등을 하기에 용이하게 설치되었는가?			
	3	통행 및 피난을 방해할 수 있는 장애물(의자, 자판기, 공중전화 등) 및 돌출물(못, 철물)이 있지 않은가?			
화장실	1	바닥은 미끄러운 상태인가?			
	2	화장실에 설치된 전기설비는 양호한 가?			
	3	화장실은 깨끗한가?			
관리소	1	상주인원에 의한 시설 관리가 이루어지고 있는가?			
	2	상주인원 부재 시 비상연락이 가능한 연락망은 게시되어 있는가?			
전기 소방	1	시설 관리자의 책임 아래 전기시설을 적절히 관리하고 있는가?			
	2	소화기가 정해진 위치에 있는가?			
	3	소화기의 충전량은 적정한가?			
	4	위험시설에는 외부인이 출입할 수 없도록 통제하고 있는가?			

5. 비상대응계획

1) 비상 대책 매뉴얼

기상변화에 대한 대비

행사의 영향을 줄 수 있는 기상 변화에 대한 세심한 관심과 사전 대비책 마련
최근 5년간의 해당일 강우량과 풍속을 참고하고, 우천 가능성을 3일 전까지 수시 체크
우천 예상 시 행사장 세팅 계획 변경 (리허설 기간은 폭우와 세우 상관없이 진행)
행사 당일 폭우가 아닌 세우 경우 행사 강행
풍속에 대한 시설물 상해 및 안전사고 사전 예방

STAGE	강풍 예보 시 무대 시설물 고정 밸트 (보조 고정 장치 등) 추가 설치
SYSTEM	강풍 예보 시 시설물 낙상 대비 및 고정장치 추가
랜탈물품	천막 : 10m/s 이상 시 웨이트 보강 작업 의자, 테이블 : 10m/s 이상 철수하여 텐트에 보관

상황별 발생 상황에 따른 매뉴얼 수립

발생 상황	내용
환자발생	경미한 사고 시 대처가능한 응급키트 활용 긴급 환자 발생 시 신속한 보고 후 병원으로 후송 조치
경호	사전교육을 받은 운영요원 인력 배치 통제 불가능 상황의 경우 경찰에 협조 요청
화재	소방 안전을 위한 소화기구 비치, 비상대피로 안내 화재발생 시 신속히 소방서에 협조 요청, 진입로 사전 체크 및 확보
정전 및 누전	행사에 소요되는 전기 용량 사전 체크 전기 시설물관련 참가자 접근금지 및 진행요원 감전사고 방지교육
천재지변 (기상이변)	상황 발생 시 대피로 사전 확보 및 방송을 통해 긴급 대피유도 사전 기상상황 수시 체크 / 우천 예보 시 우비 또는 우산 사전 준비
시스템 제작물 고장	실시간 상황공유 및 상주 전문가 투입, 긴급 복구, 백업 기자재 준비
운영인력 불참	운영요원의 불참 시 대체 인력 투입 업무 별 팀장을 임명하여 책임감 형성

플랜 A
시간당 (10mm-13mm)

· 참가객 : 우천 용품 지급 (우의/ 협의 후 진행) / 지속적인 강수 체크
· 무대 : 무대 바닥 상태 점검 (방수 비닐 & 방수 커버)
· 시스템 : 전 시스템 방수 장비 설치 (방수 비닐, 커버 준비)
· 전력 (발전차) : 감전 우려 지역 철저하게 점검 및 누전 방지 처리 장비 사용 (방수 케이블 및 누전차단 콘센트 사용)

플랜 B
시간당 (13mm-19mm)

· 참가객 : 우천 주의 안내방송 / 관람객 주요 동선 상태 점검 (미끄럼 방지)
· 무대 : 방수커버 설치 및 무대 슬로프, 계단 안전점검
· 시스템 : 각 시스템 방수커버 설치
· 전력 : 각 시스템 별 전기 전력 점검

플랜 C
시간당 (20mm이상)

· 관람객 : 실시간 폭우 안내 방송으로 관람객 동요 방지(구역별 상태 재 점검 후 관람객 퇴장 및 대피 동선 확보 / 위험 구역 차단)
· 무대 : 배수로 점검 및 확보를 통한 무대 하중 최소화
· 시스템 : 각 시스템 담당자 비상 대기 및 점검
· 전력 : 안전을 최우선 화 한 유관 기간 협의하에 진행 여부 결정 및 확정

Part Ⅲ. 사업관리

5. 비상대응계획

1) 안전관리 조치 매뉴얼

01	02	03	04	05
확인	신고 및 보고	응급조치	사고처리	사후관리
사고현장 확인 및 인명 등 피해상황 파악	상황에 따라 119/해당팀장에게 즉시 신고&보고	매뉴얼에 따른 응급조치 심폐소생술 등	사고조사 원인분석 내규, 방침, 매뉴얼 등에 따라 처리	원인조사 및 분석 재발요인검토 개선
최초발견자	발견자 119/해당팀장	최초발견자 / 해당팀장	안전사고담당자	안전사고담당자

사고발생 시 조치사항

초동조치

사고현장주변의 응급조치 및 신속한 지원 요청
안전관리계획에 따라 경찰관, 소방관, 안전요원 등 즉시 출동
관람객의 동요방지 및 질서유지, 2차 사고 발생 방지, 비상 대피 요령 등 안내 방송 실시
외부인의 사고현장 접근을 막고 경찰관에게 현장관리 인계
화재발생 시 인근 소화기 등으로 초동 대처 후 소방차 출동 요청

응급구호 및 지원요청

관람객 상해 시 구급.의료반에 요청하여 신속하게 구호 실시
화상 환자의 경우 사전 진료가능 병원 파악 후 신속하게 후송
신속한 사고처리를 위해 상황실에 지원을 요청, 상호협조체제 유지하여 신속하게 사고 처리

유관기관 및 의료 협조체계

체계적인 행사 안전 매뉴얼에 따른 긴급상황 대비
구급대, 병원 엠블란스 등과 연계, 긴급 후송체계를 확립한 의료 시스템

응급환자 발생 시 보고체계

돌발상황 발생 시, 참가자 문의·요구사항 응대를 위한 안전관리 전담조직 구축
재난안전관리 기관인 고양시 재난안전대책본부와 협조체계 구축
종합상황실 조직과 이를 통한 신속한 대응으로 '안정적인 비상 - 안전관리' 확립

Part Ⅲ. 사업관리

5. 비상대응계획

1) COVID-19, 전염병 등 상시체크 실행 가이드 마련

구 분	1단계	2단계	3단계	4단계
개 념	지속적 억제상태 유지	지역 유행·인원 제한	권역 유행·모임 금지	대유행·외출금지
기 준	전 국 : 500명 미만 수도권 : 250명 미만	전 국 : 500명 이상 수도권 : 250명 이상	전 국 : 1,000명 이상 수도권 : 500명 이상	전 국 : 2,000명 이상 수도권 : 1,000명 이상
모 임	방역 수칙 준수	8명까지 가능	4명까지 가능	4명 까지 가능 오후 6시 이후 2명까지 가능
정부 방역 지침 (행사, 축제)	500명 이상 집회 지자체 사전 신고	100인 이상 금지	50인 이상 금지	행사 금지
행사 적용	기본 방역 수칙 준수 , 지자체 사전신고	비대면 행사 일부 병행 검토	대면행사 일부 축소, 비대면 행사 병행 검토	대면행사 취소 비대면 행사 진행
행사 진행 여부	정상 진행 *공연: 1m 거리두기	참석자 99인으로 제한 진행 *공연: 1m 거리두기/사전예약제	참석자 49인으로 제한 진행 *공연: 1m 거리두기/사전예약제	주최 측 협의
공통 사항	마스크 착용, 행사장 환기 및 소독, 손소독제 비치, 체온 측정 및 출입명부 작성, 거리두기 등 정부 방역 수칙 준수 유튜브 및 홈페이지 등을 통해 온라인 현장 중계 진행			

코로나-19 등 전염병 대응 방역 관리 계획

코로나19 등 관람객 감염병 적극 대응하기 위해 안전감독관 상시 체크 및 각종 전염병 등에 대한 세부 실행가이드 마련

사회적 거리 두기, 손 씻기, 마스크 착용 등 정부 방역 지침을 기본으로 행사장 방역 매뉴얼 작성

코로나19 방역 운영팀을 별도로 구성하여 행사 전·후로 행사장 방역 및 관련 조치 사항 수시 체크

코로나-19 질병 정보 및 행동 수칙 사전 안내방송

코로나 19 방역 지침 및 행동수칙 사전 안내방송 진행

개인 방역 물품 지급

개인 물품 소독을 위한 알코올 소독제 등 지급, 예비 마스크 확보 후 수시 지급

COVID-19 재유행시 통과형 에어샤워 설치

관람객이 입장할 때 묻은 먼지와 세균을 알코올로 소독 서비스 실시

행사 전/후 현장 스텝 전원 체온측정 신속한 대처로 확산 방지가능

IV

홍보 / 마케팅

1. 홍보전략 수립
2. 기념품 디자인 / 제작

Part Ⅳ. 홍보 / 마케팅

1. 홍보전략 수립

1) 홍보전략

Part Ⅳ. 홍보 / 마케팅

2. 홍보물 디자인 / 제작

1) 메인 행사 디자인 및 홍보물 제작

▲계절 고려 단체복 350장 제작

▲포스터(100장) 외 각종 홍보물 일체

END=AND

「광안리 발코니 음악회」의 성공을 위하여 최선을 다할 것을 약속 드립니다.

감사합니다.
